

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

OBRA : EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

DATA: 19/08/2021

LOCAL: AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO -PA

CONTRATO CPL: 230/2021

EMPRESA: ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA




BDI: 28,29%

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS CONTRATADOS					QUANTIDADES				TOTAL SERVIÇOS EXECUTADOS				EXEC. %
		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	SALDO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	SALDO	
1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30.000,00	R\$ 41,65	R\$ 53,43	R\$ 1.602.900,00		4.875,00	4.875,00	25.125,00	R\$ -	R\$ 260.471,25	R\$ 260.471,25	R\$ 1.342.428,75	16,25%
1.1	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	1.260,00	R\$ 5,60	R\$ 7,18	R\$ 9.046,80		204,75	204,75	1.055,25	R\$ -	R\$ 1.470,11	R\$ 1.470,11	R\$ 7.576,70	16,25%
1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	13.200,00	R\$ 4,37	R\$ 5,61	R\$ 74.052,00		2.145,00	2.145,00	11.055,00	R\$ -	R\$ 12.033,45	R\$ 12.033,45	R\$ 62.018,55	16,25%
TOTAL						R\$ 1.685.998,80					TOTAL	R\$ 273.974,81	R\$ 273.974,81	R\$ 1.412.024,00	16,25%

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR	% DA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO
1ª MEDIÇÃO	06/07/2021 A 19/08/2021	R\$ 273.974,81	16,25%	R\$ 273.974,81	16,25%	R\$ 1.412.024,00

Redenção, 19 de agosto de 2021

 Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro	 Assinatura, sob carimbo, do fiscal do contrato	 Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado
---	--	---

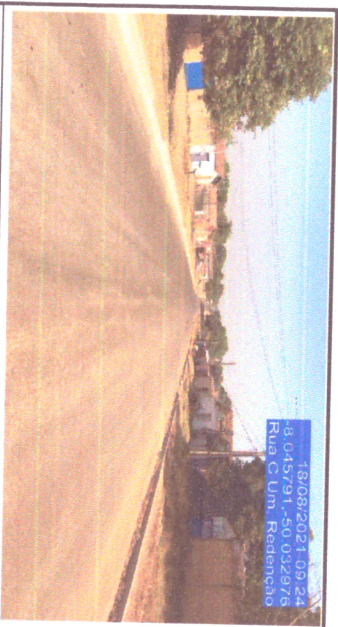



Wesley T. de Almeida Junior
Engenheiro Civil
Sec. Obras
CREA 10152005400 - GO



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEMÇÃO/PA

CONTRATADA:	ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J.:	23.348.665/0001-96
CONTRATO:	230/2021	DATA:	quinta-feira, 19 de agosto de 2021
PERÍODO:	06/07/2021 A 19/08/2021	MEDICÃO:	1
OBJETO:	EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

	<p>Localização</p> <p>Rua Giovane de Queiroz</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>		<p>Localização</p> <p>Rua C - 1</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>
	<p>Localização</p> <p>Rua Luis Vargas Dumont</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>		<p>Localização</p> <p>Rua Geovane de Queiroz</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>
	<p>Localização</p> <p>Rua Luis Vargas Dumont</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>		<p>Localização</p> <p>Rua C - 1</p>	<p>Serviço</p> <p>meio-fio e sarjeta</p>

Wesley T. de Almeida
Wesley T. de Almeida
Engenheiro CMM
Soc. Obras
CREA 10152005-0/PA - GP

Francisco Rodrigues Filho

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA :	EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	DATA:	19/08/2021
LOCAL:	ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	BDI:	28,29%

1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	EXTENSÃO (M)		UNIDADE	TOTAL
		4875,00		m	4.875,00
					4.875,00
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	LARGURA (M)	PROFUNDIDADE (M)	EXTENSÃO (M)	TOTAL (M²)
	Sarjeta	0,30	0,07	4875,00	102,38
	Meio-fio	0,14	0,15	4875,00	102,38
					204,75
1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	LARGURA (M)		EXTENSÃO (M)	TOTAL (M²)
	Sarjeta	0,30		4875,00	1.462,50
	Meio-fio	0,14		4875,00	682,50
					2.145,00


Wesley T. de Almeida Junior
Engenheiro Civil
Sec. Obras
CREA 101520054/D - GO



