




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO						
Local:	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES			Área:	567,72	m²
Ação:	Construção de uma Quadra Poliesportiva na EMEF Alacid Nunes			Data:20/05/2021	BDI:	21,15%
Município:	Redenção-PA			Data de referência:	SINAPI S/DESON. ABR/2021	
ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.531,35 <b>100,00%</b>			R\$ 34.531,35	6,87%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 7.672,87 <b>33,33%</b>	R\$ 7.672,87 <b>33,33%</b>	R\$ 7.675,17 <b>33,34%</b>	R\$ 23.020,92	4,58%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.020,42 <b>100,00%</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,42	0,40%
4	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.856,95 <b>100,00%</b>		R\$ 0,00	R\$ 2.856,95	0,57%
5	FUNDAÇÕES	R\$ 32.460,83 <b>100,00%</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.460,83	6,46%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 138.024,11 <b>100,00%</b>	R\$ 0,00	R\$ 138.024,11	27,45%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 40.848,03 <b>50,00%</b>	R\$ 40.848,03 <b>50,00%</b>	R\$ 81.696,05	16,25%
8	PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.053,44 <b>100,00%</b>	R\$ 59.053,44	11,75%
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.172,06 <b>100,00%</b>	R\$ 30.172,06	6,00%
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.991,54 <b>100,00%</b>	R\$ 3.991,54	0,79%

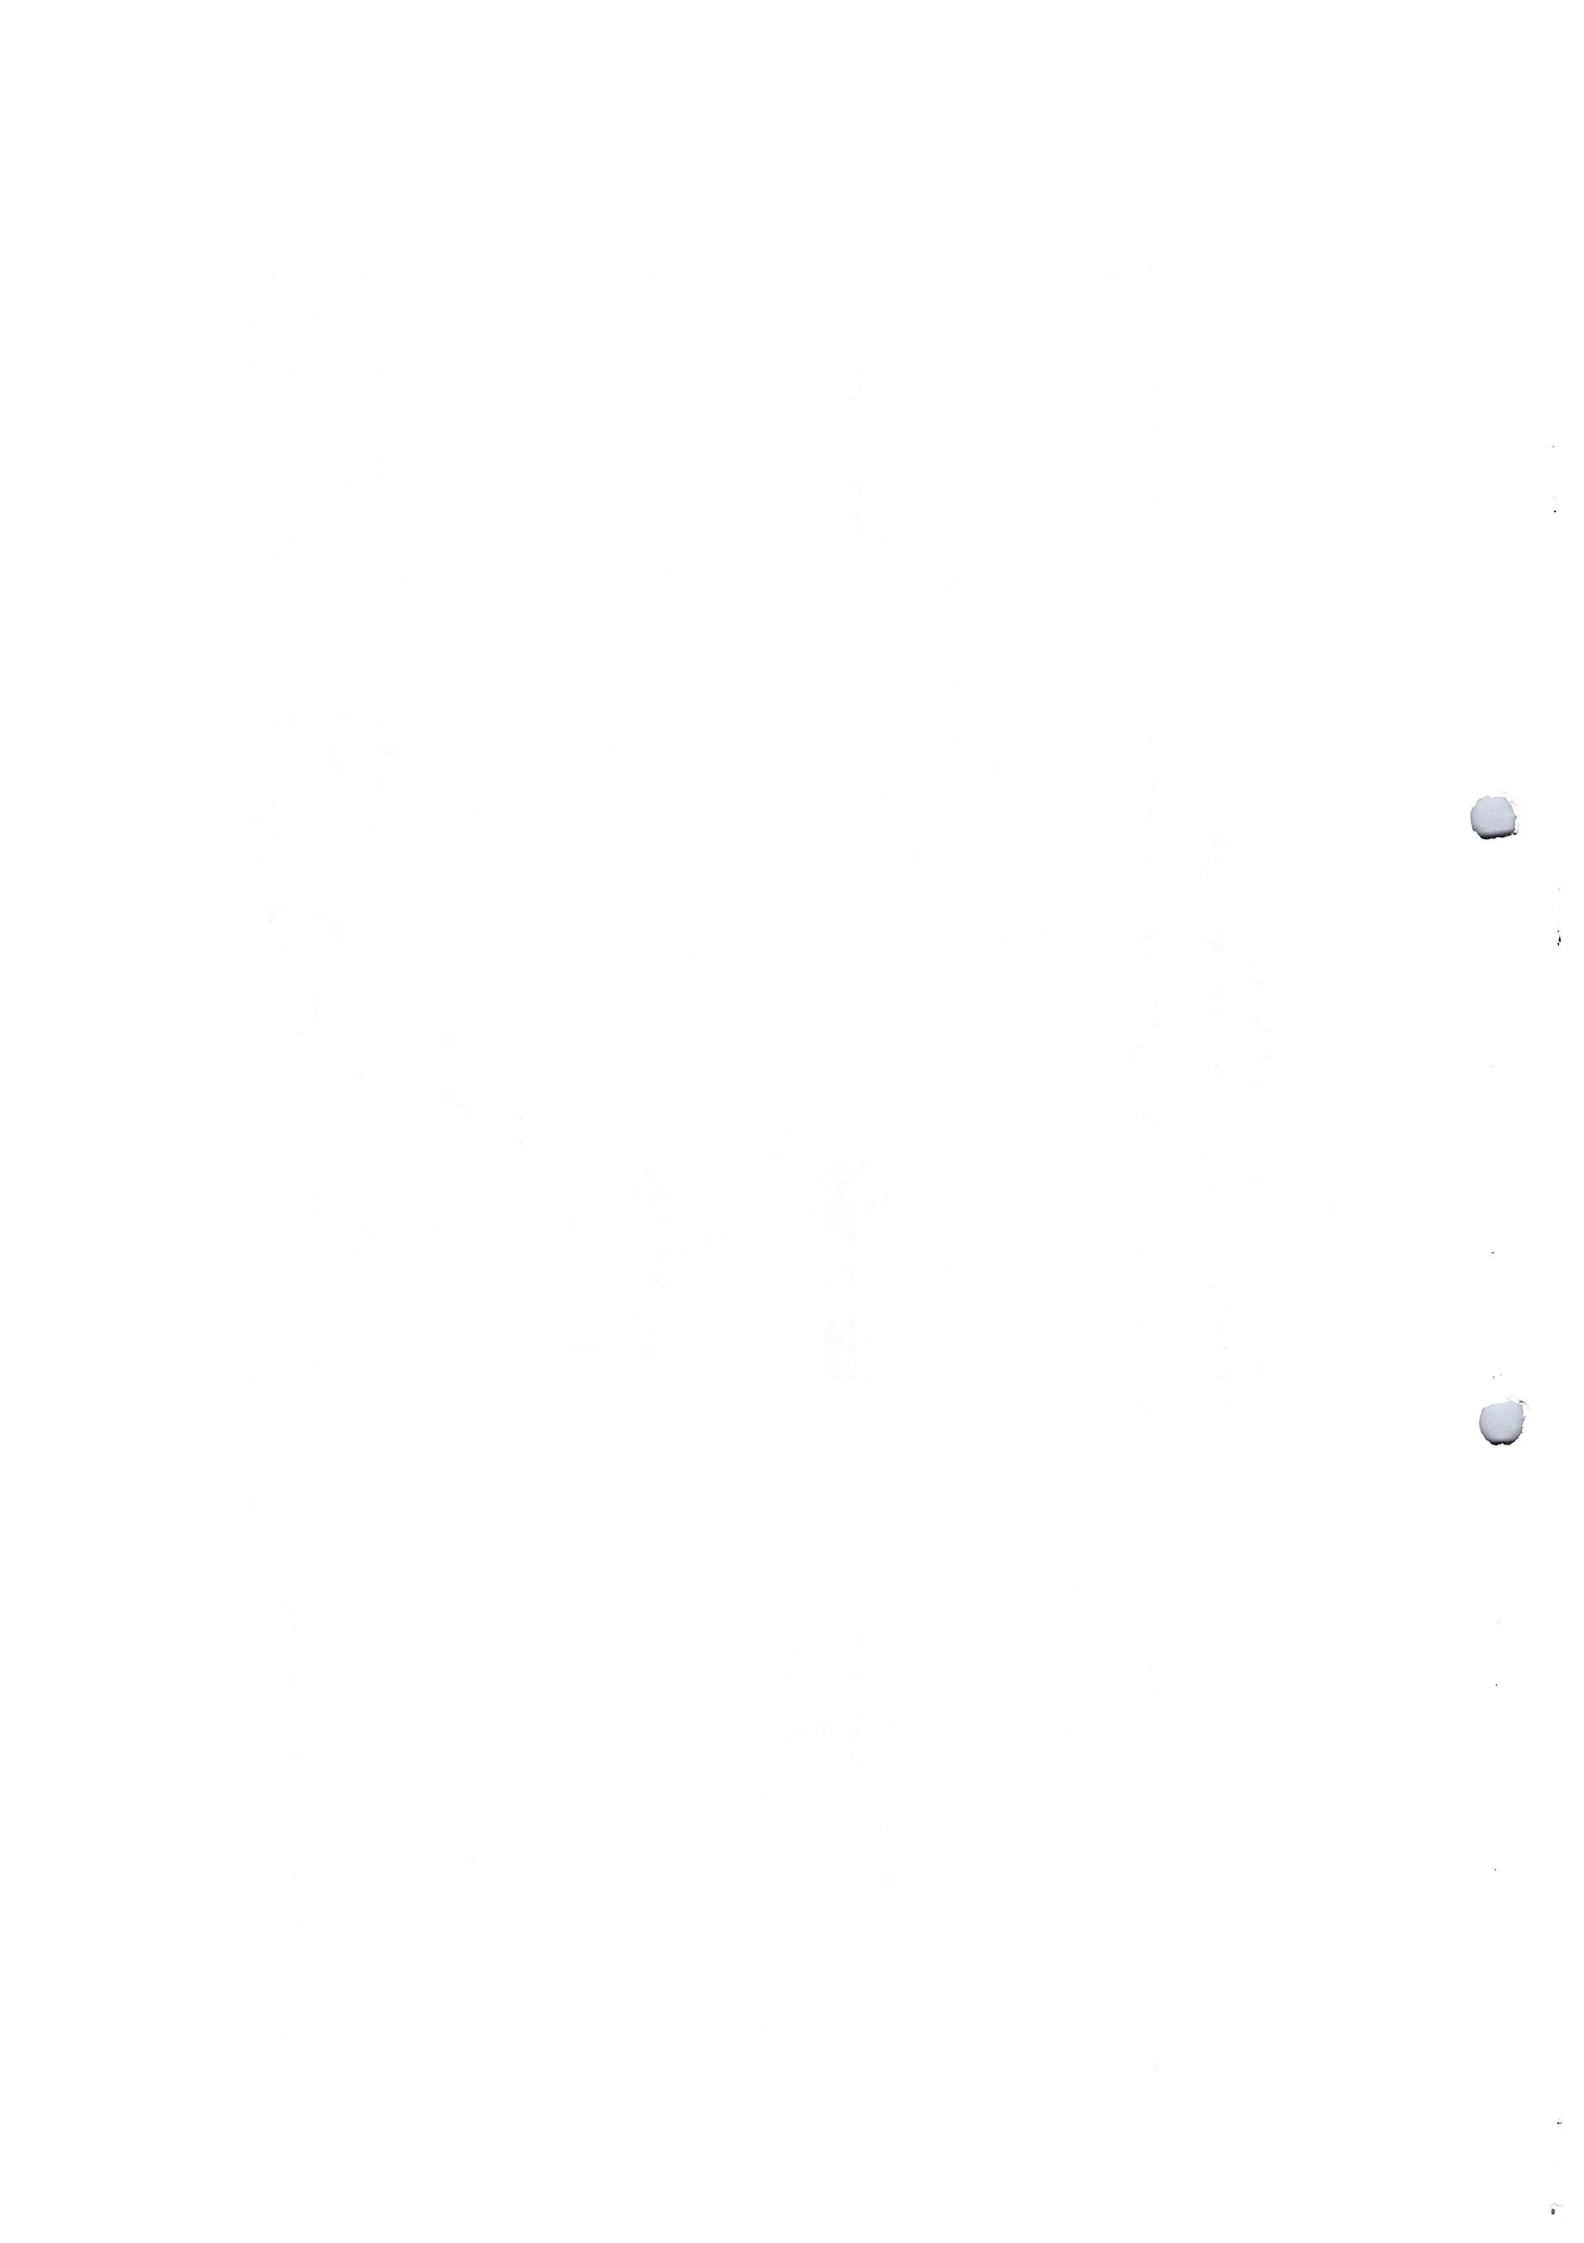

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	TOTAL COM BDI	%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.721,77 100,00%	R\$ 15.721,77	3,13%
12	SPDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.760,03 100,00%	R\$ 10.760,03	2,14%
13	PASSARELAS, MURETAS E PORTÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.132,94 100,00%	R\$ 29.132,94	5,79%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.378,68 100,00%	R\$ 38.378,68	7,63%
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,58 100,00%	R\$ 922,58	0,18%

<b>PARCIAIS SIMPLES</b>	R\$ 79.542,42	R\$ 186.545,01	R\$ 236.656,24	R\$ 502.743,67	
<b>PERCENTUAIS SIMPLES (%)</b>	15,82%	37,11%	47,07%	<b>100,00%</b>	
<b>PARCIAIS ACUMULADOS</b>	R\$ 79.542,42	R\$ 266.087,43	R\$ 502.743,67		
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)</b>	15,82%	52,93%	100,00%		

LUCAS BORGES  
NUNES:0254730426  
0

Assinado de forma digital por  
LUCAS BORGES  
NUNES:02547304260  
Dados: 2021.06.14 18:10:32 -03'00'

---

LUCAS BORGES NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PA 151797920-0

