



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
JUSTIFICATIVA DE REPROGRAMAÇÃO

Obra: Obras de pavimentação asfáltica.

Local: Rua do Barbosa, Av. Jeremias Lunardelli, Rua Laranjeiras, Rua Esperança e Av. Olga Lustosa

O empreendimento de pavimentação asfálticas das ruas e avenidas acima mencionadas, referente ao convênio nº 770147/2012 entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Redenção – Pa, teve obras iniciadas no ano de 2014 com justificativa de facilitar o tráfego na região, tendo em vista o trânsito intenso nos locais de intervenção. Com isso contribuirá com o desenvolvimento municipal, além de beneficiar a população residente nas margens das vias com infraestrutura em pavimentação asfáltica em TSD.

As vias estão localizadas conforme as imagens abaixo:

- **RUA DO BARBOSA**



- **AVENIDA JEREMIAS LUNARDELLI**



- **RUA ESPERANÇA**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



- **RUA LARANJEIRAS**



- **AVENIDA OLGA LUSTOSA / AVENIDA JK**



A obra teve execução de 73,93% referente ao valor global licitado, com execução pela Construtora Terra Santa em um total de 10 medições, sendo a última datada de 13 de junho de 2018 a 26 de junho de 2018. A partir desta data não foram executados os serviços e a obra



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ultrapassou o prazo máximo de execução de obras, por este fato foi encerrado o vínculo com a empresa.

Foi realizada reprogramação no ano de 2020, porém a empresa vencedora da licitação não realizou o contrato e este veio a ser finalizado.

O projeto de reprogramação de obra parte do objetivo de retomada e conclusão do empreendimento, uma vez que a obra se encontra inacabada, com grande parte das ruas e avenidas sem a infraestrutura completa, deixando assim estas sem a funcionalidade correta para o tráfego e para a acessibilidade nos locais.

A reprogramação da obra consiste no término da pavimentação asfáltica da rua do Barbosa, execução de pavimentação externa de calçadas com acessibilidade e sinalização viária em todas as ruas do contrato, utilizando os mesmos métodos anteriormente empregados através de Tratamento Superficial Duplo – TSD e piso intertravado.

É importante esclarecer que todas as etapas irão abranger as partes a serem executadas e que contemplava inicialmente em planilha do convênio em questão e não foram executadas.


Assim, torna-se indispensável a retomada da obra, uma vez que infraestrutura, não estando completa, apresenta sem funcionalidade a população do município. Vale lembrar que apenas uma porcentagem da obra licitada foi executada, ficando ainda a ser implantado as pavimentações externas, asfálticas e sinalização viária das ruas e avenidas. A Prefeitura Municipal de Redenção busca por meio deste processo a solução dos problemas existentes de obra, para assim, a população poder usufruir dos seus benefícios.

**WESLEY TEIXEIRA DE
ALMEIDA
JUNIOR:97387053200**

Assinado de forma digital por
WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
JUNIOR:97387053200
Dados: 2021.04.13 09:42:49
-03'00'

Wesley Teixeira de Almeida Junior
Engenheiro Civil
CREA 1015200540

DMT – MATERIAL ASFÁLTICO – RUA DO BARBOSA

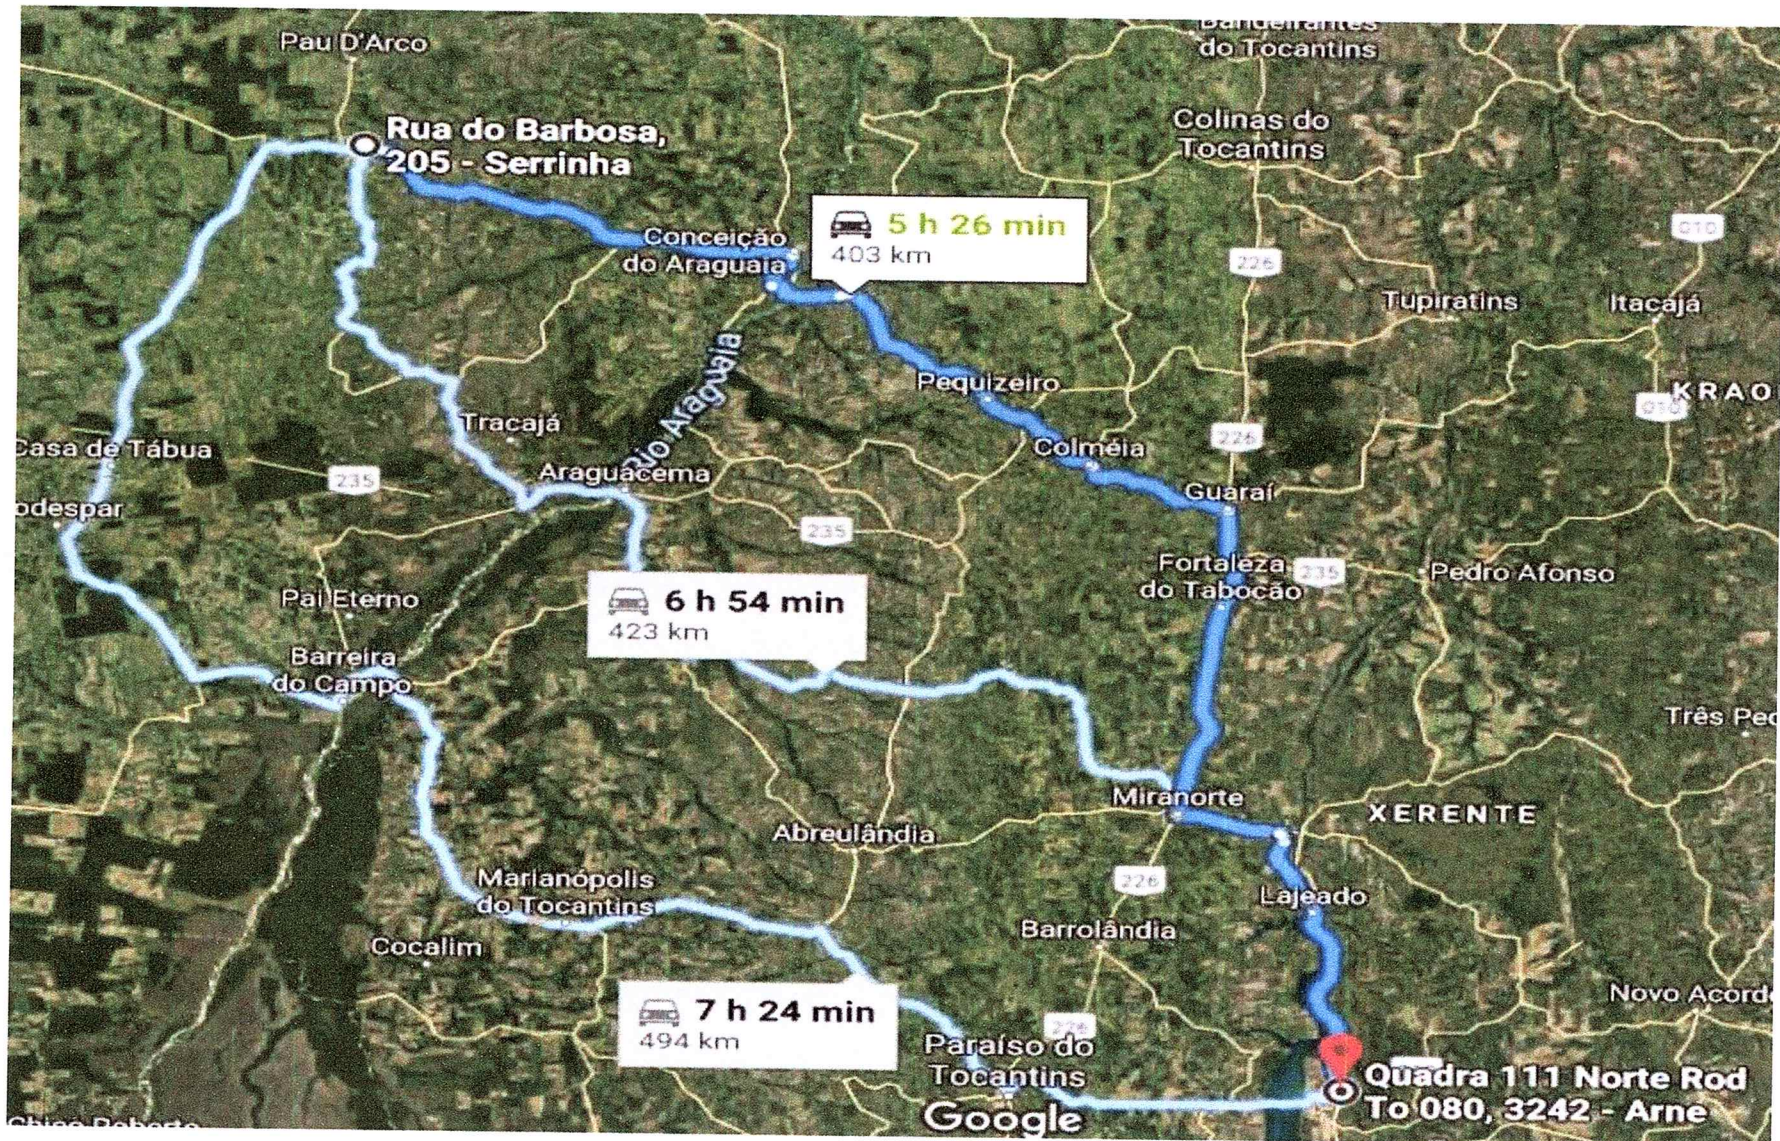

WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
JUNIOR:97387053200

Assinado de forma digital por WESLEY
TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR:97387053200
Dados: 2020.05.07 15:55:22 -03'00'

DMT – BRITA – RUA DO BARBOSA



WESLEY TEIXEIRA DE
ALMEIDA
JUNIOR:97387053200

Assinado de forma digital por
WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
JUNIOR:97387053200
Dados: 2020.05.07 15:54:56
-03'00'


DMT – BOTA-FORA (ENTULHO) – RUA ESPERANÇA



WESLEY TEIXEIRA DE
ALMEIDA
JUNIOR:9737053200

Assinado de forma digital por
WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
JUNIOR:97387053200
Dados: 2020.05.06 15:54:22 -03'00'

DMT – BOTA-FORA (ENTULHO) – AV. OLGA LUSTOSA E AV. JK

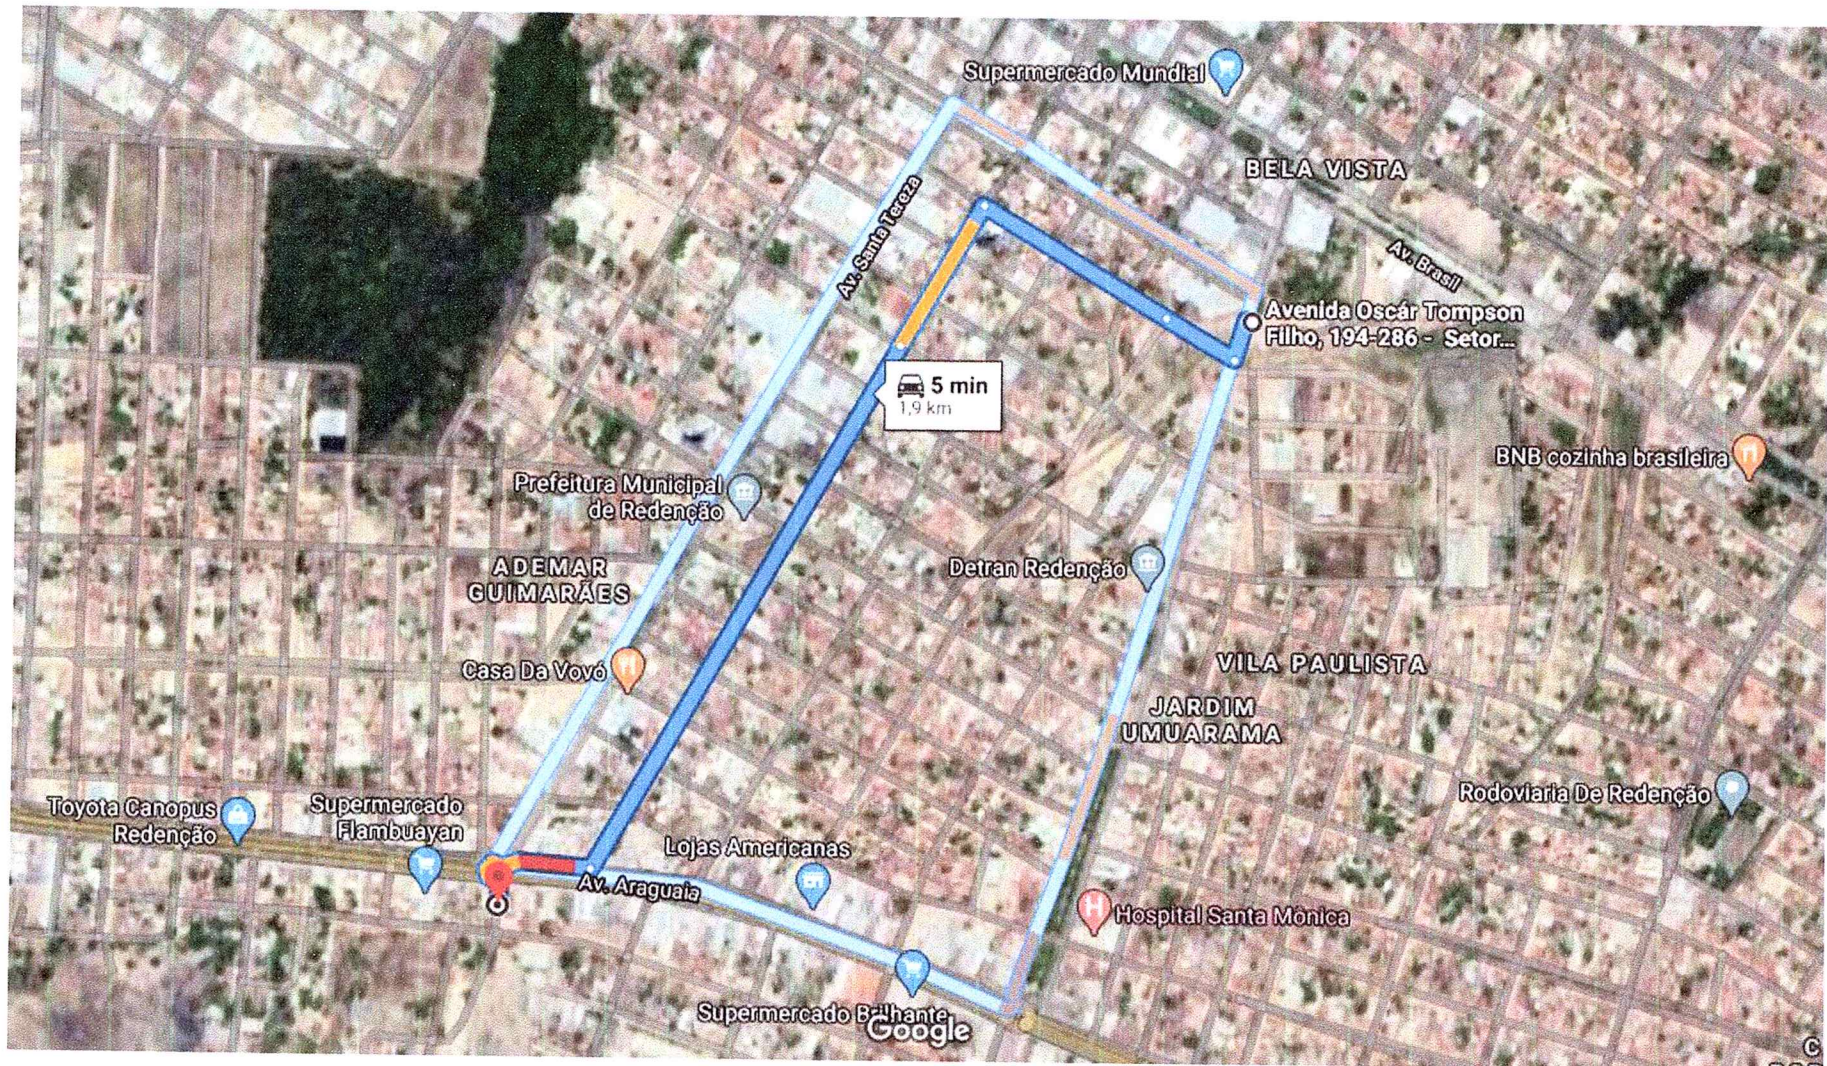

WESLEY TEIXEIRA DE
ALMEIDA
JUNIOR:97387053200

Assinado de forma digital por
WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
JUNIOR:97387053200
Dados: 2020.05.07 15:53:30 -03'00'
